


Cronoprogramma - Comune di Cortino - Edificio Riunione Sportelle-Calcara

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	1
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	3
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	3
9	H	Smobilitazione cantiere	1
10	I	Fine lavori	1

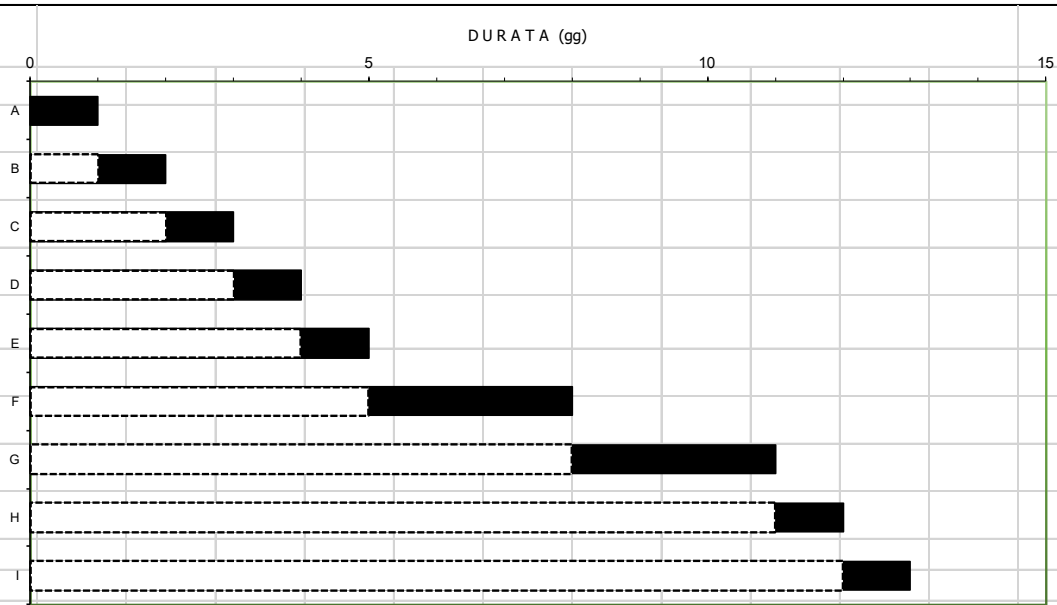


Durata complessiva

13

Cronoprogramma - Comune di Cortino - Sorgente Sportelle

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	2
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	2
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	5
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	3
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	3
9	H	Smobilitazione cantiere	4
10	I	Fine lavori	1

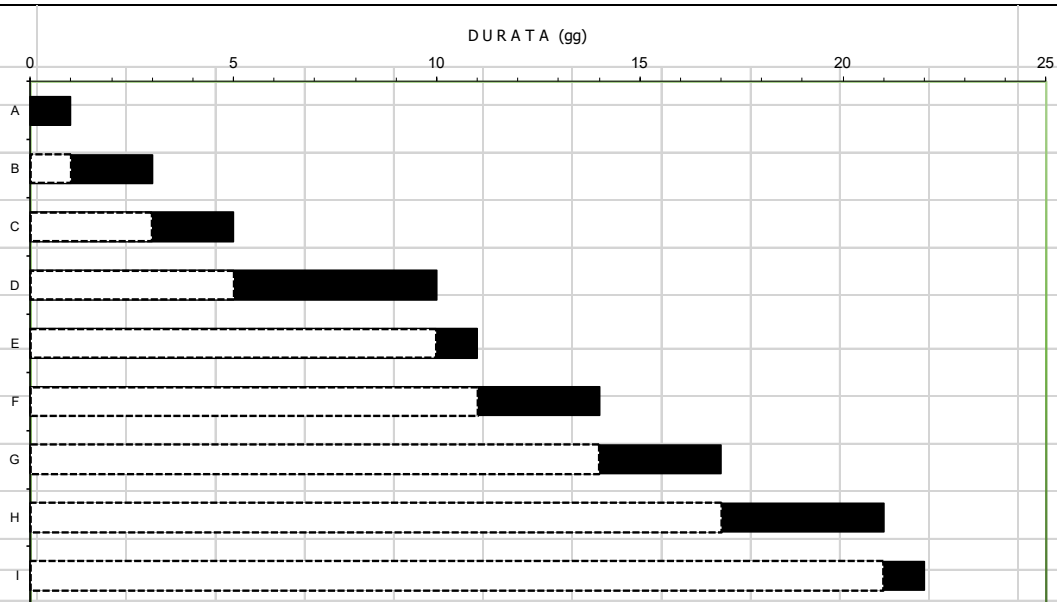


Durata complessiva

22

Cronoprogramma - Comune di Crognaleto - Sorgente Mercurio


N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	1
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	2
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	2
9	H	Smobilizzazione cantiere	1
10	I	Fine lavori	1

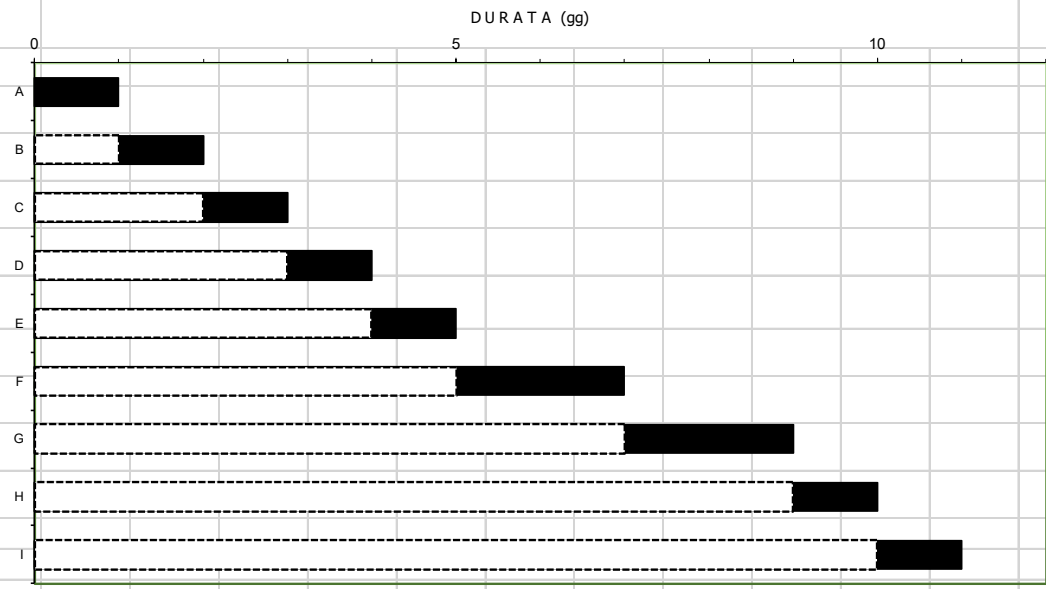

Durata complessiva	11
--------------------	-----------

Cronoprogramma - Comune di Crognaleto - Partitore Mercurio-Orso

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	1
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	2
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	2
9	H	Smobilizzazione cantiere	1
10	I	Fine lavori	1

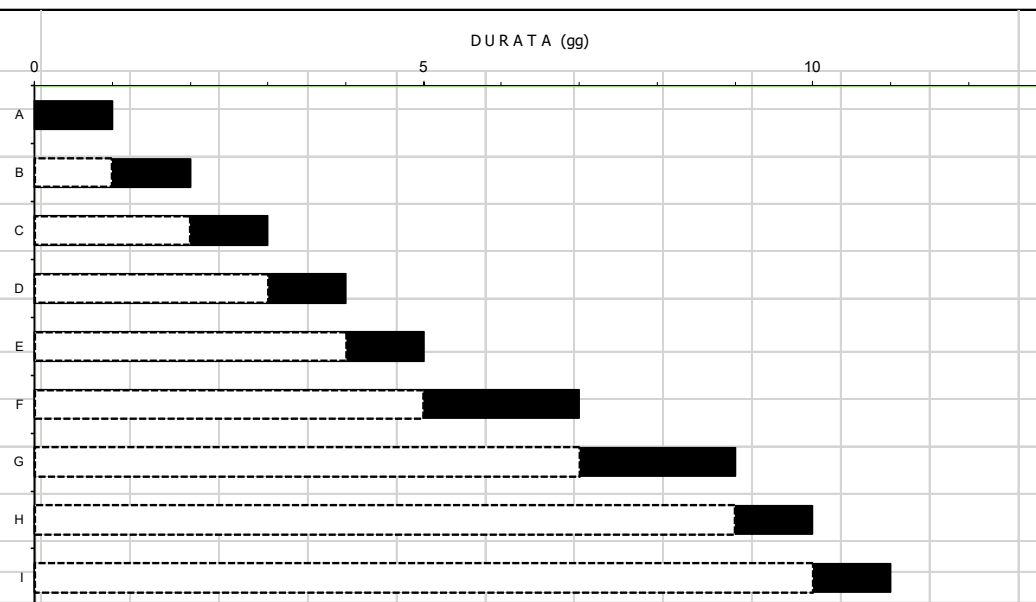


Durata complessiva

11

Cronoprogramma - Comune di Crognaleto - Sorgente Figliola Micciola

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	1
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	3
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	3
9	H	Smobilizzazione cantiere	1
10	I	Fine lavori	1

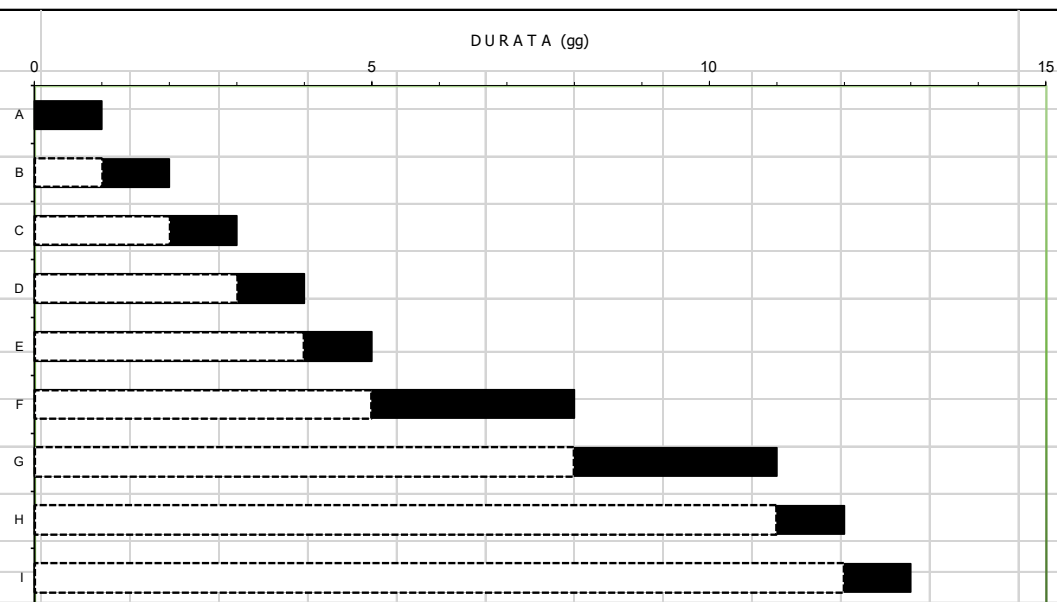


Durata complessiva

13

Cronoprogramma - Comune di Crognaleto - Sorgente Malbove

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	1
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	3
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	3
9	H	Smobilizzazione cantiere	1
10	I	Fine lavori	1

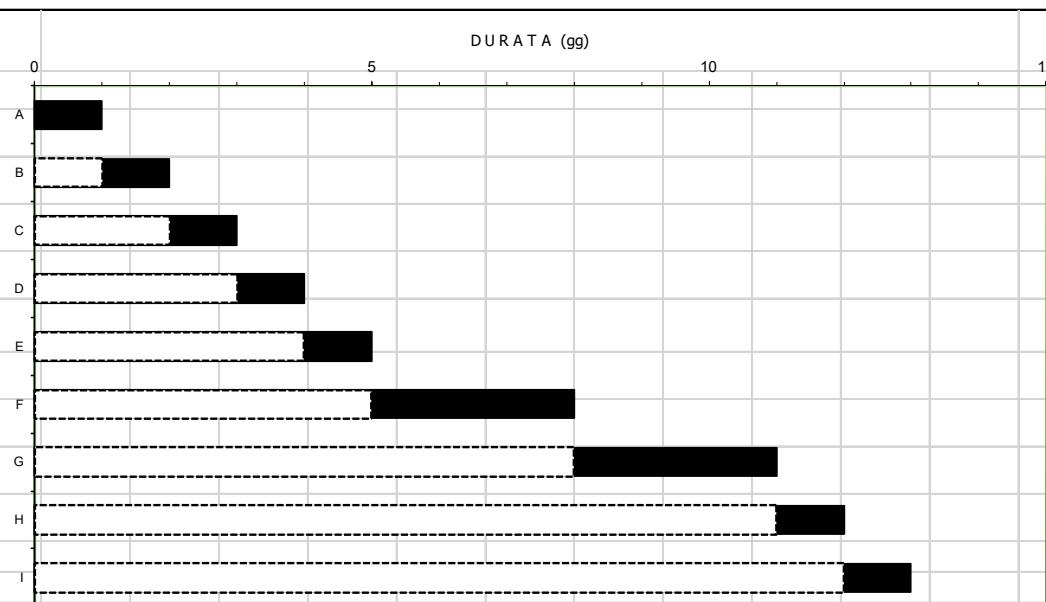


Durata complessiva

13

Cronoprogramma - Comune di Isola del Gran Sasso - Serbatoio San Nicola

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	2
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	4
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	1
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	1
9	H	Smobilitazione cantiere	2
10	I	Fine lavori	1

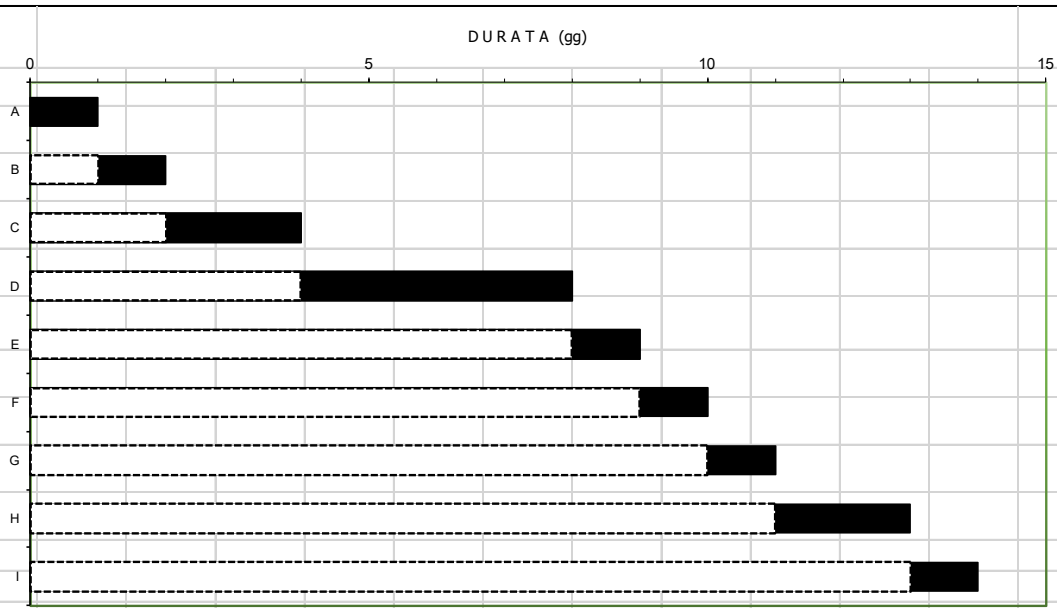


Durata complessiva

14

Cronoprogramma - Comune di Isola del Gran Sasso - Sorgente Acquatina

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	2
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	1
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	4
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	4
9	H	Smobilitazione cantiere	1
10	I	Fine lavori	1

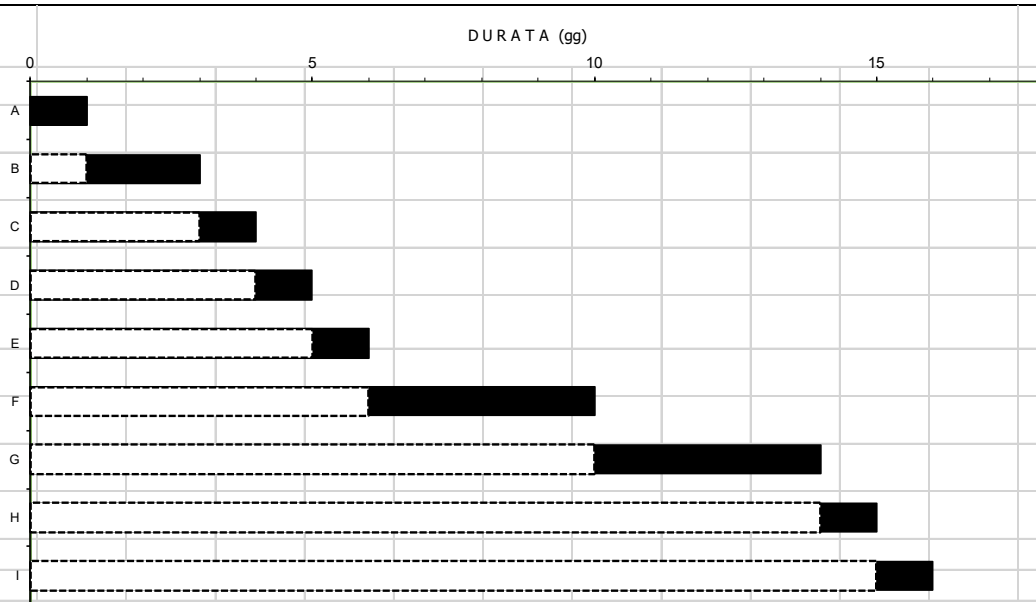


Durata complessiva

16

Cronoprogramma - Comune di Isola del Gran Sasso - Sorgente Tre Fonti


N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	2
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	6
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	1
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	1
9	H	Smobilitazione cantiere	2
10	I	Fine lavori	1

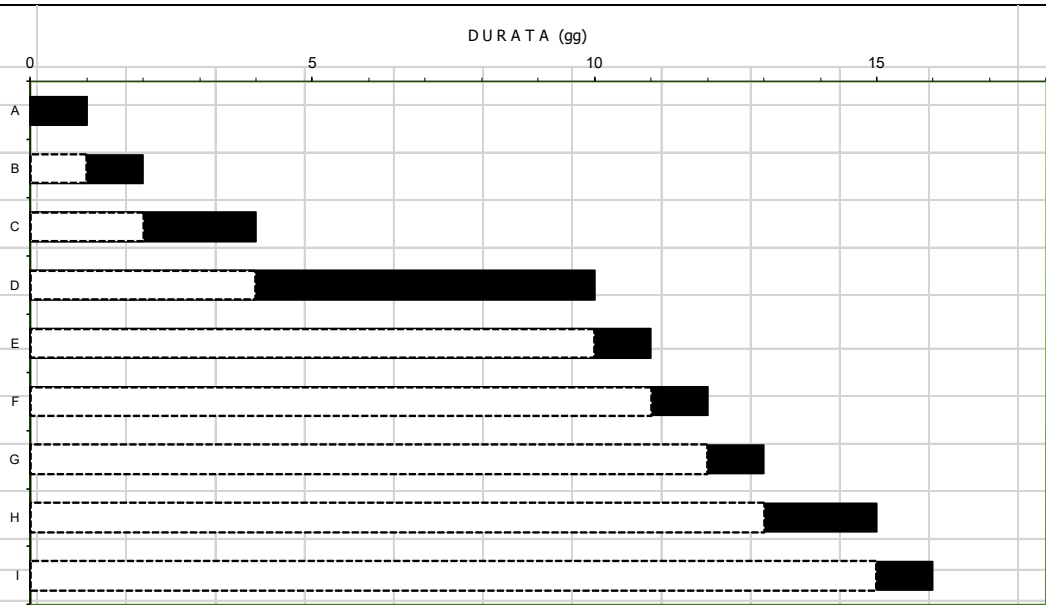

Durata complessiva **16**


Cronoprogramma - Comune di Isola del Gran Sasso - Sorgente San Nicola

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	2
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	8
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	1
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	1
9	H	Smobilitazione cantiere	2
10	I	Fine lavori	1

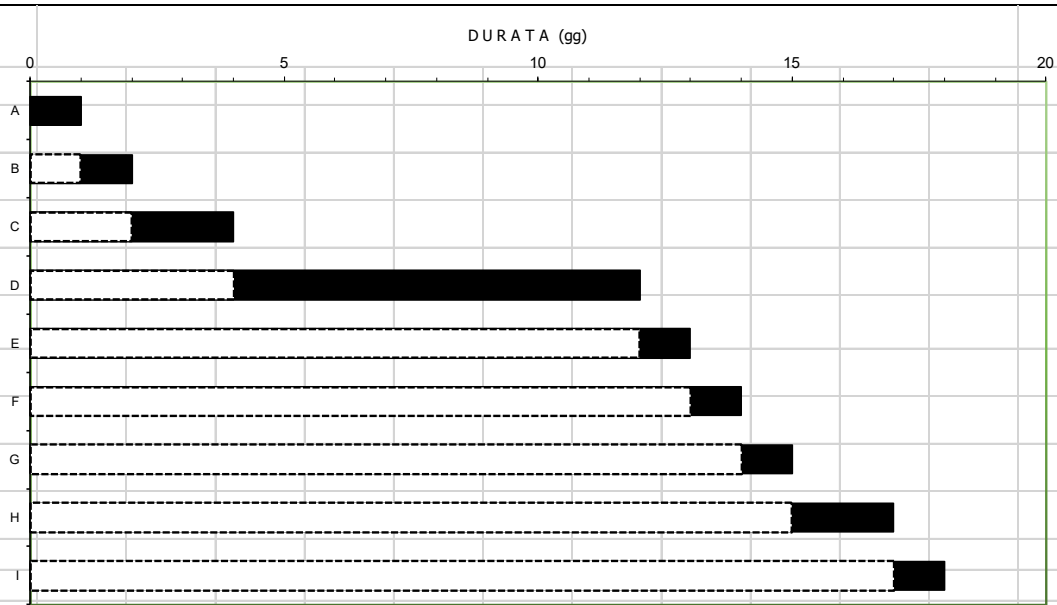


Durata complessiva **18**


Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Serbatoio Pietracamela

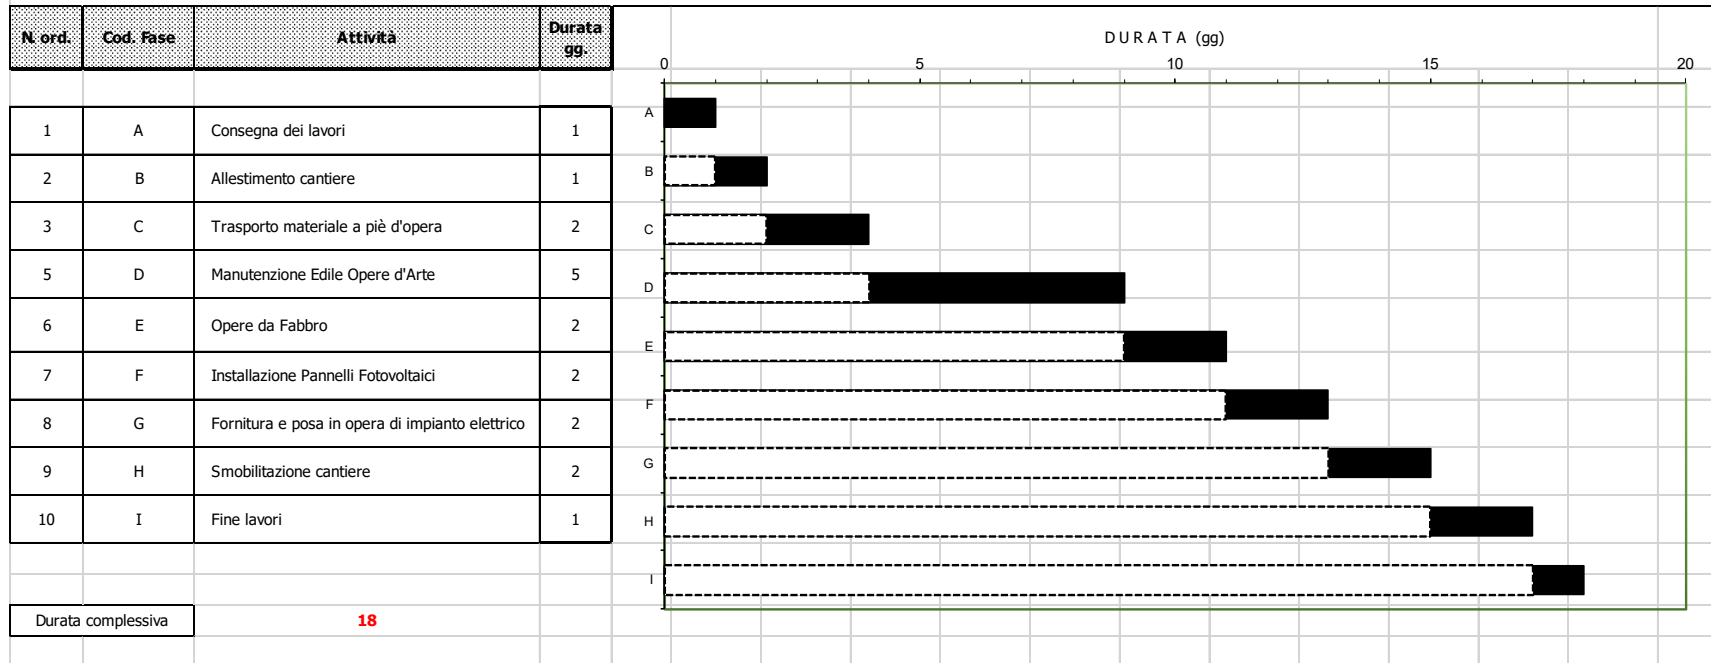


Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Serbatoio Intermesoli

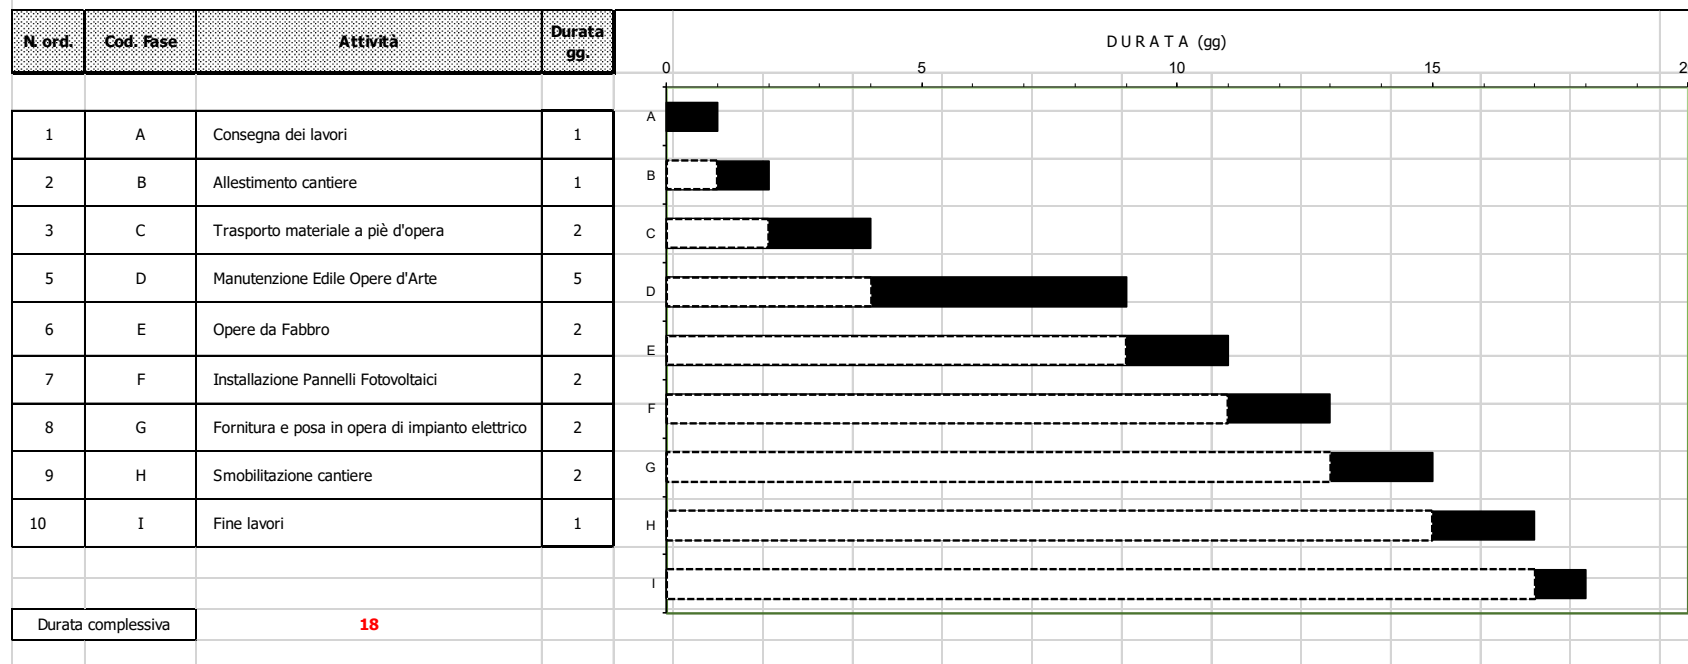


Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Sorgente Rio Arno Alta

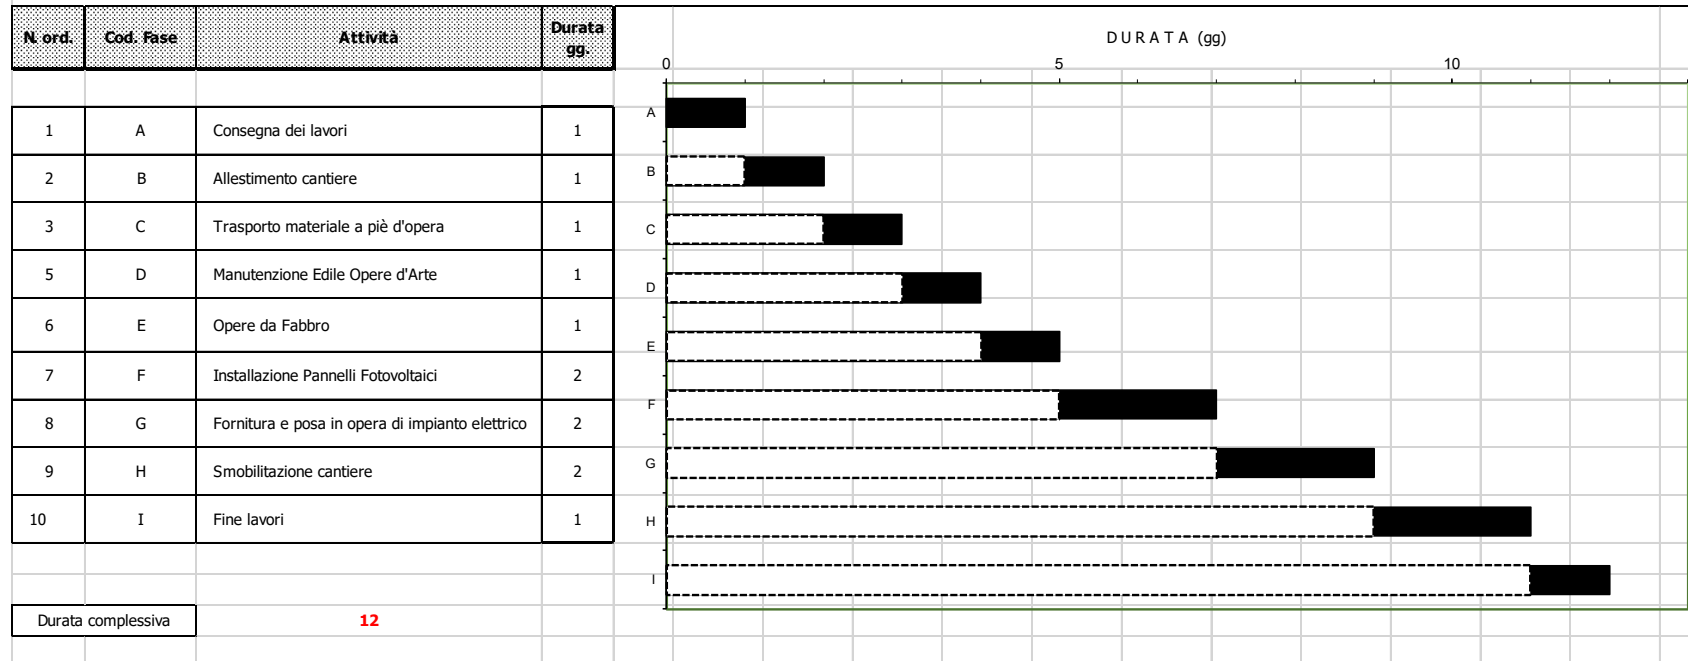


Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Sorgente Fonticelle

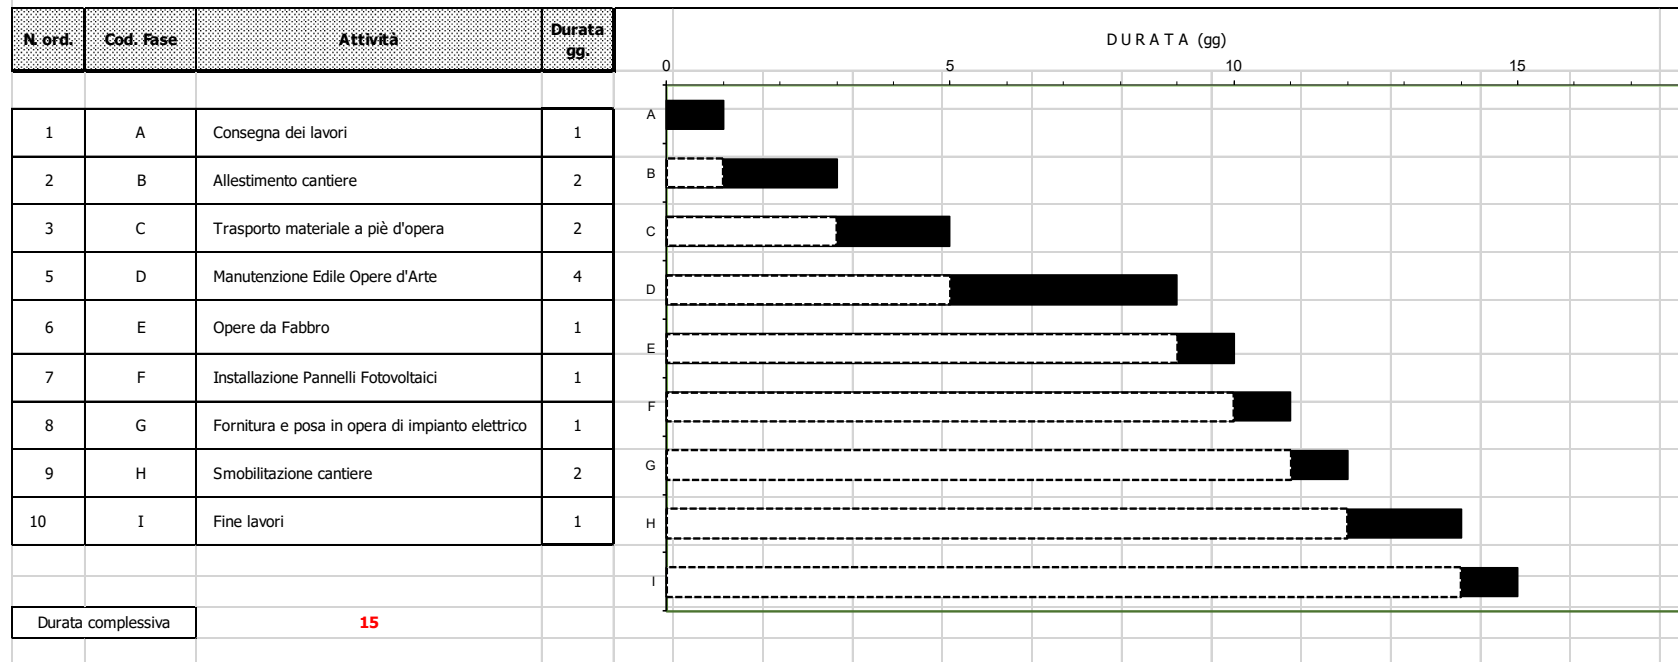

Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Sorgente Zippitilli

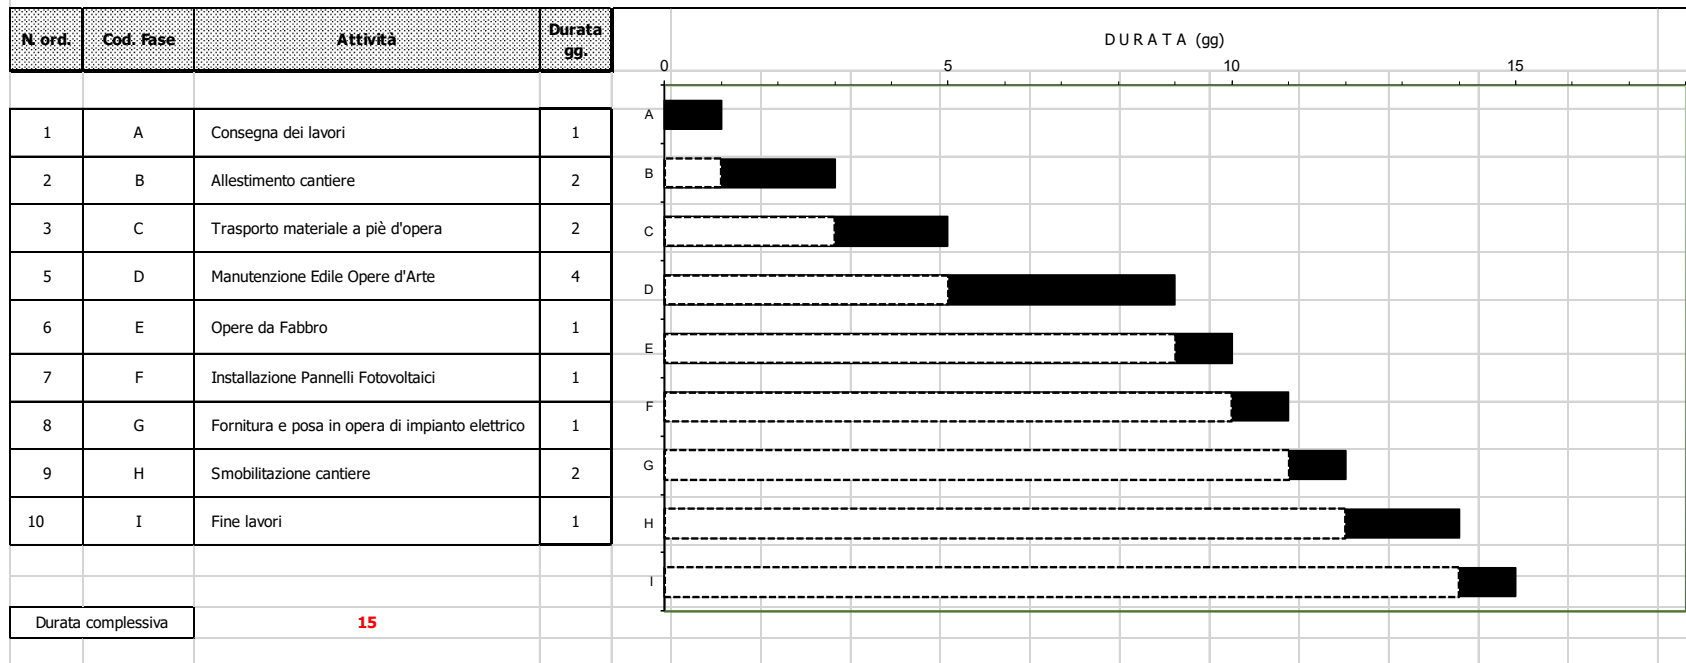


Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Sorgente Trignano

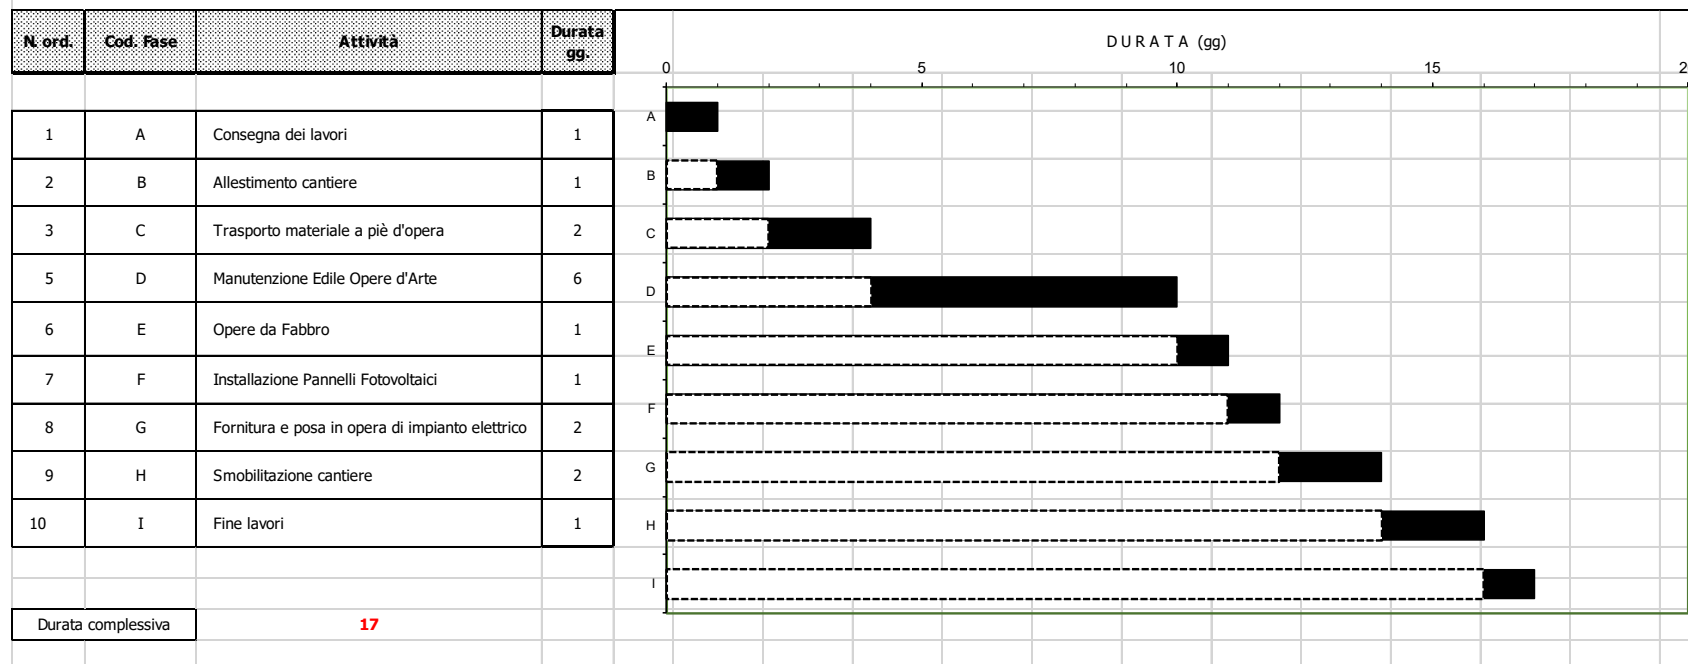

Cronoprogramma - Comune di Pietracamela - Sorgente Venacquaro

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	2
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	2
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	4
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	1
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	1
9	H	Smobilitazione cantiere	2
10	I	Fine lavori	1

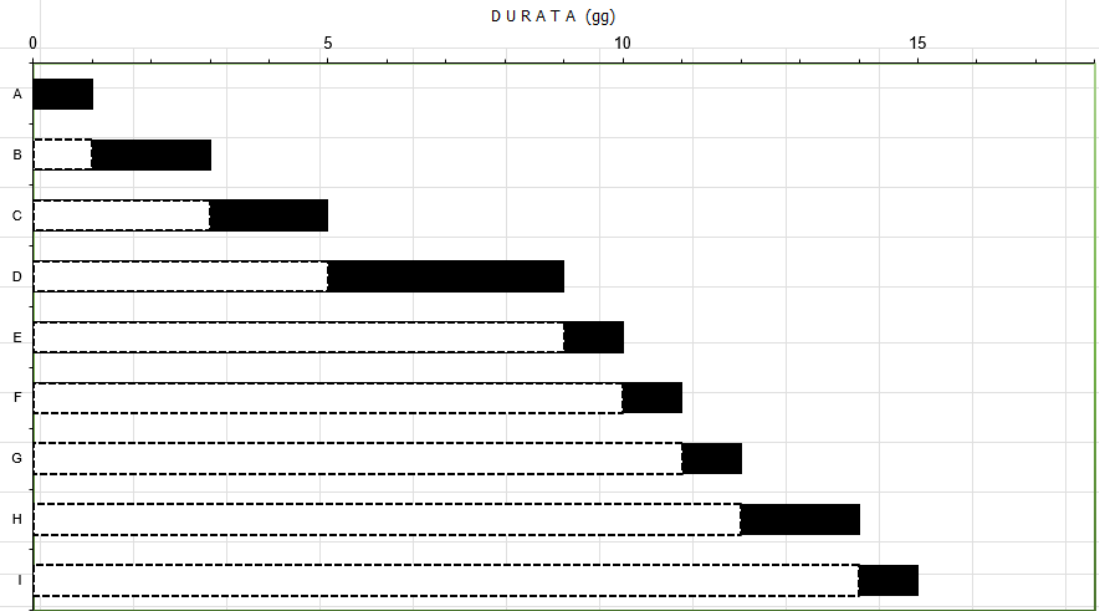

Durata complessiva

15

Cronoprogramma - Comune di Rocca S. Maria - Sorgente Guardiaboschi

N. ord.	Cod. Fase	Attività	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	1
2	B	Allestimento cantiere	1
3	C	Trasporto materiale a piè d'opera	2
5	D	Manutenzione Edile Opere d'Arte	1
6	E	Opere da Fabbro	1
7	F	Installazione Pannelli Fotovoltaici	4
8	G	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico	4
9	H	Smobilizzazione cantiere	2
10	I	Fine lavori	1
Durata complessiva		17	

